Индивидуализированное предложение на базе типового проекта Скандик S -24/18

Сборное временное модульное сооружение кемпинга для гостей глэмпинга 39, 6 кв.м (Скандик S -24/18)

A	B	C
№	**Наименование**	**Стоимость**
1	Фундамент (винтовые сваи)	104 000,00
2	Пиломатериалы и комплектующие	1 102 900,00
3	Работы с учетом проекта	780 440,00
	Доп. услуги	
4	Электрика с разводкой	150 000,00
5	Мебель	250 000,00
6	Сантехника (туалет, душевая, смесители, котел)	150 000,00
7	Доставка / разгрузка	50 000,00
	ИТОГО	**2 587 340,00**

Описание проекта

Порядок оплаты: аванс 20% при заключении договора, 60% промежуточный платеж через 30 дней после заключения договора, 20% окончательный платеж после приемки объекта. Срок строительства 60 рабочих дней.

Цена на сваи ориентировочная, точная цена выставляется по результатам пробного бурения.

В стоимость свайного фундамента не включена строительная техника, которая может потребоваться для выполнения дополнительных работ, таких как выемка камней, скос травы, спил деревьев, корчевка пней, уборка снега и пр.

Состав модульного сооружения:

Одноэтажное сооружение с плоской наплавляемой кровлей

• Каркас из сухой строганой доски, сорт АБ, полы и кровля 45х195, наружные стены 45х145, внутренние перегородки 45х95

• Утепление мин.ватой Knauf Терморол: 200 мм пол, 200мм кровля.

• Утепление Роквул Лайт Баттс: 150мм наружные стены, 100 мм перегородки

Окна и двери:

• Двухкамерные стеклопакеты с i напылением

•Металлопластиковые двери и окна с двухкамерными стеклопакетами, поворотно-откидные

• Межкомнатные финские двери белые

Наружная отделка:

• Крашеная доска 20х95мм

• Терраса террасная доска 28х145

• Перила доска строганная 45х95

Чистовая внутренняя отделка:

• Вагонка штиль 20х145мм

• Ламинат на полу

• СУ керамогранит

Коммуникации, санузел:

• Вся электрика: светильники, розетки, выключатели, электрощит с автоматами

• Разводка труб водопровода, канализации

• Унитаз, раковина, душ


• Смесители

• Электрический теплый пол

Мебель:

• Кухня , кровать, стол, диван

Планировка

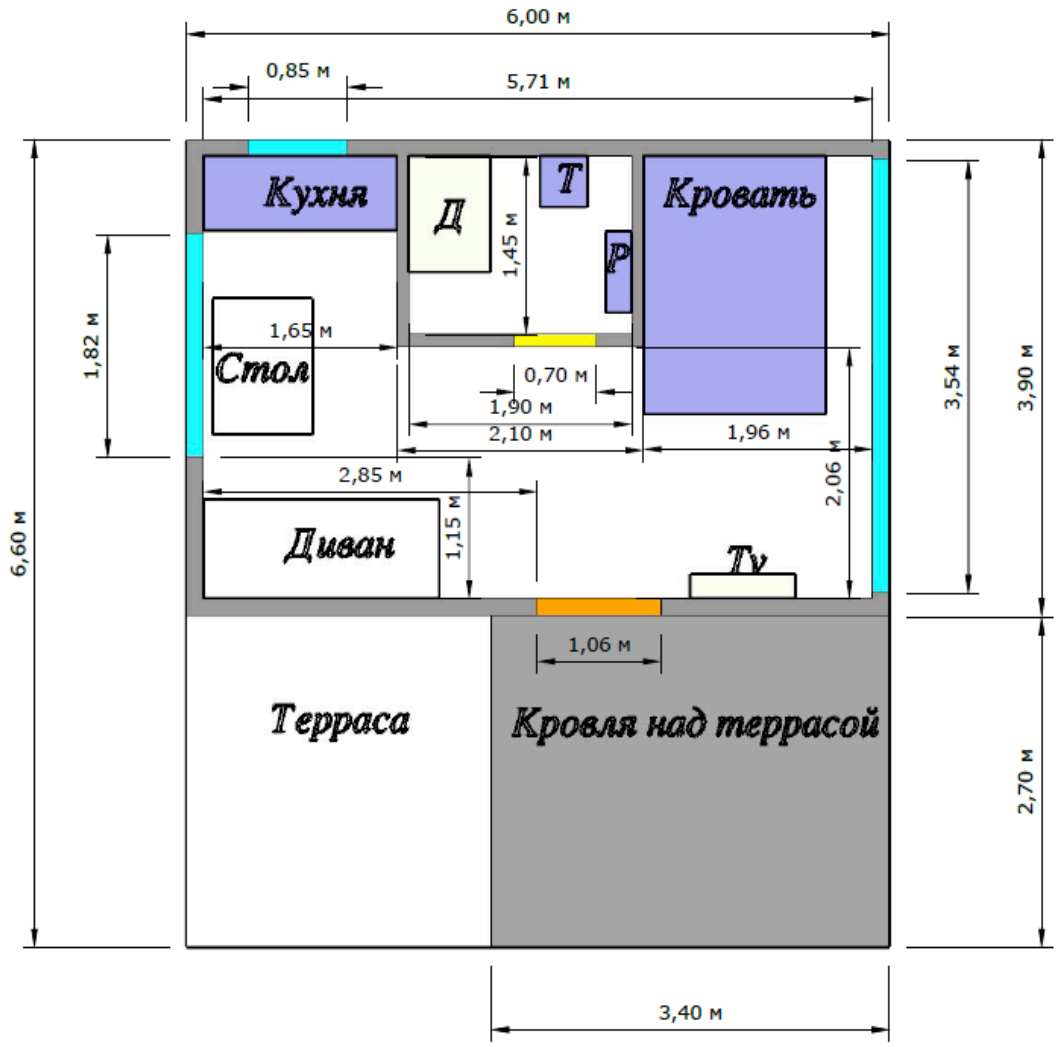

Визуализация и примеры ранее реализованных проектов сборно-разборного кемпинга Скандик S -24/18









+7 (981) 812 25 88 ▬ ИП Михаленко В.В. ▬ IG: @SEVERBUILDINGS

г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков 67 к 2, кв 31
